


MANAJEMEN PRODUKSI PAMERAN KARYA MULTIMEDIA

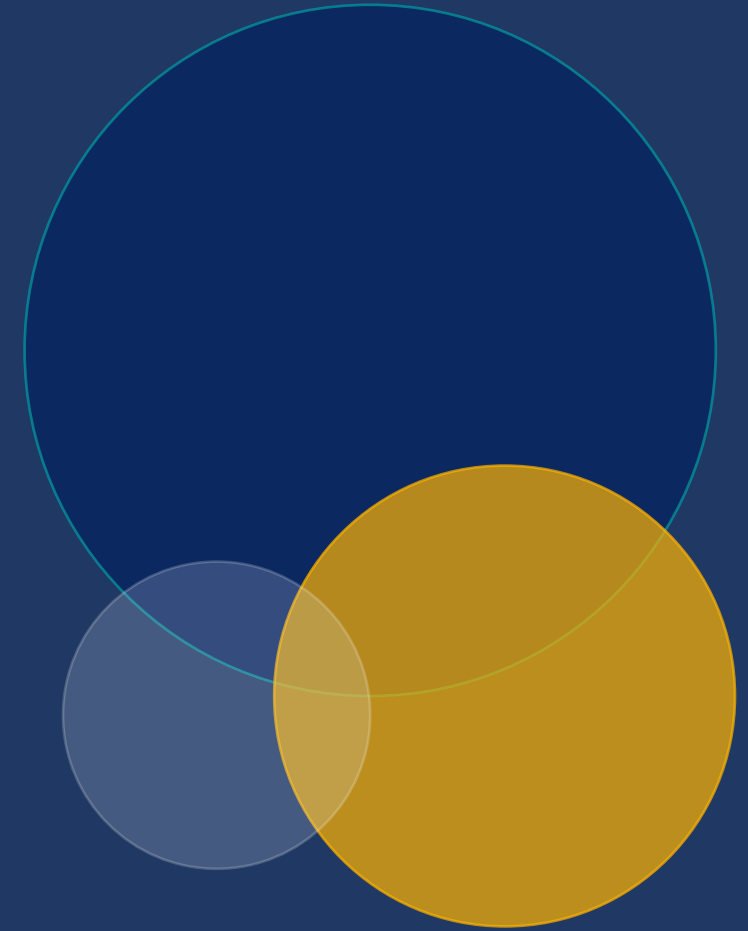

Mengapa manajemen produksi pameran penting?

Pameran multimedia = proyek berbasis waktu, anggaran, teknologi, dan pengalaman pengunjung

1

Pameran ≠ sekadar menaruh karya

Karya media (video mapping, interaktif, VR/AR, audio) bergantung pada sistem teknis, ruang, dan operator yang andal.

2

Proyek dengan tenggat mati

Tanggal pembukaan tidak bisa mundur; kesalahan jadwal berdampak pada seluruh rantai produksi.

3

Banyak disiplin bertemu

Kurator, desainer, engineer AV, programmer, tim konstruksi, humas, dan keamanan harus terkoordinasi.

Peran Anda sebagai lulusan TRM: menjembatani teknologi dan pengalaman — memastikan karya tampil sesuai maksud kreatornya, aman, dan tepat waktu.

Enam tahap produksi pameran

Kerangka umum yang disarikan dari praktik pengembangan pameran museum dan seni media (Dean, 1994; Lord & Piacente, 2014)

1

Konsep & Riset

Tema, target audiens, tujuan; studi lokasi; kurasi awal; studi kelayakan

2

Perencanaan

Tim & peran, RAB, jadwal (Gantt), register risiko, izin & asuransi

3

Desain & Pengembangan

Denah alur, desain ruang, desain interaksi; prototipe & uji teknis; daftar I/O

4

Produksi & Instalasi

Produksi konten, fabrikasi, pemasangan, wiring, kalibrasi, uji sistem (commissioning)

5

Operasi & Pembukaan

Gladi resik, SOP harian, crowd control, pemeliharaan, dokumentasi

6

Evaluasi & Bongkar

Survei pengunjung, laporan KPI, deinstalasi, pengarsipan aset & pembelajaran

Langkah kerja praktis & dokumen kunci

Alur yang saya terapkan pada proyek pameran multimedia

Langkah kerja

1. Tetapkan brief & tujuan terukur (KPI)
2. Survei lokasi: listrik, jaringan, beban lantai, cahaya, akustik
3. Susun daftar karya + kebutuhan teknis tiap karya
4. Buat RAB, jadwal mundur dari tanggal buka, register risiko
5. Prototipe & uji karya interaktif sebelum fabrikasi
6. Instalasi bertahap, lalu uji sistem dan kalibrasi
7. Gladi resik dengan skenario pengunjung nyata
8. Buka, pantau, pelihara; evaluasi & dokumentasikan


Dokumen kunci

- Project brief & kerangka kuratorial
- RAB dan jadwal (Gantt)
- Technical rider & daftar I/O perangkat
- Denah alur pengunjung & tata cahaya
- Cue sheet / run-of-show
- SOP operasi & prosedur darurat
- Register risiko
- Laporan evaluasi & serah terima aset

Anggaran dan manajemen risiko

Contoh alokasi ilustratif — sesuaikan dengan skala dan jenis proyek

Contoh alokasi anggaran (%)

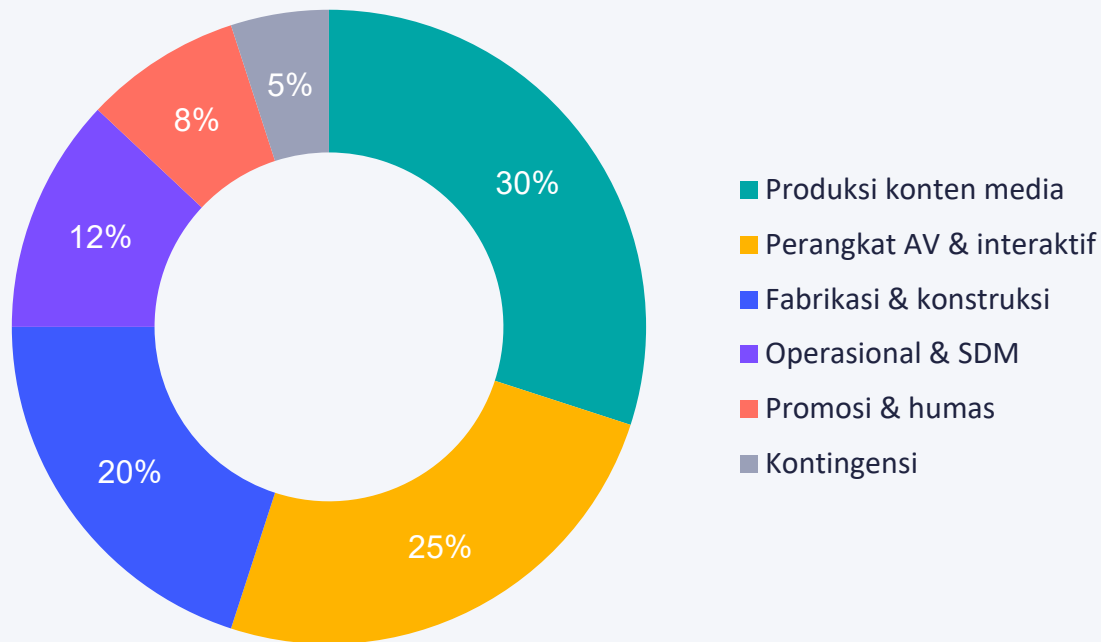

Risiko yang sering muncul

- Perangkat gagal / overheat → siapkan cadangan (spare) proyektor, PC, kabel
- Sinkronisasi audio-video meleset → uji end-to-end, kontrol terpusat
- Antrean membludak → tiket berjadwal, batas kapasitas
- Keterlambatan konten → tenggat internal lebih awal dari tenggat pameran
- Kerusakan oleh pengunjung → desain tahan lama, staf pemandu

Studi kasus 1: teamLab Borderless, Tokyo

Museum seni digital imersif skala besar

2018

dibuka di Odaiba, Tokyo

±2,3 jt

pengunjung tahun pertama (dilaporkan)

2024

dibuka ulang di Azabudai Hills

Praktik manajemen yang bisa dipelajari

- Ratusan proyektor & komputer dikendalikan sistem terpusat
- Karya dirender real-time dan berinteraksi dengan pengunjung
- Tiket terjadwal untuk mengendalikan kepadatan
- Operasi harian: pemantauan teknis dan pemeliharaan rutin

Pelajaran untuk mahasiswa

- Rancang sistem teknis dan alur pengunjung sejak tahap desain, bukan setelah instalasi
- Anggaran operasional & pemeliharaan sama pentingnya dengan biaya produksi
- Kapasitas ruang menentukan pengalaman — kelola dengan data
- Sumber: teamlab.art (data resmi museum & Guinness World Records)

Studi kasus 2 & 3: instalasi interaktif dan pameran lokal

2

Rain Room (Random International)

Instalasi hujan yang berhenti di sekitar pengunjung, memakai kamera pelacak gerak. Ditampilkan di MoMA New York (2013) dan kemudian di berbagai kota.

Pelajaran manajemen

- Sensor perlu kalibrasi & uji ketahanan
- Antrean panjang → batasi jumlah orang per sesi
- Perawatan air & sistem rutin sebagai bagian RAB

Sumber: random-international.com

3

ARTJOG, Yogyakarta

Pameran seni kontemporer tahunan di Yogyakarta yang berjalan sejak 2008, dengan tema kuratorial setiap edisi dan melibatkan banyak seniman.

Pelajaran manajemen

- Siklus produksi tahunan: jadwal & template dokumen baku
- Koordinasi seniman, kurator, teknisi, relawan
- Pendanaan campuran: sponsor, tiket, mitra

Sumber: artjog.id

Tugas kelompok

Rancang pameran multimedia karya tim PBL berskala kampus:

- Brief & tujuan
- Denah alur pengunjung
- Daftar kebutuhan teknis (technical rider)
- RAB dan jadwal Gantt
- List 5 risiko + mitigasinya
- Presentasi 10 menit Minggu depan.

Referensi

- Dean, D. (1994). Museum Exhibition: Theory and Practice. London: Routledge.
- Dernie, D. (2006). Exhibition Design. London: Laurence King Publishing.
- Falk, J. H., & Dierking, L. D. (2013). The Museum Experience Revisited. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
- Lord, B., & Piacente, M. (Eds.). (2014). Manual of Museum Exhibitions (2nd ed.). Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.). PMI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum.
- teamLab. teamlab.art — Borderless (informasi resmi museum).
- Random International. random-international.com — Rain Room.
- ARTJOG. artjog.id — profil dan arsip penyelenggaraan.
