

Nomor ID	:	<i>PBL-TRM528</i>
Pengusul proyek	:	<i>Happy Yugo Prasetya, S.Sn., M.Sn.</i>
Manajer proyek	:	<i>Miftahul Husna Ghawa, S.Tr.Kom.</i>
Judul proyek	:	<i>Rebranding Visual Senja Organizer</i>
Luaran	:	1. Laporan proyek dan slide presentasi. 2. Logo guideline A4 landscape, termasuk sistem identitas visual dan contoh penerapannya. 3. Video motion logo berdurasi minimal 10 detik. 4. Poster karya ilmiah berukuran A2. 5. Dokumen pengajuan HKI dan Berita Acara Serah Terima PBL. 6. Dokumen pendukung Branding Project: hasil pengujian logo beserta analisis; copywriting guideline dan tagline; prototipe produk, desain antarmuka, wireframe, dan use case; hasil pengujian usability beserta analisis; dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pameran; visualisasi portofolio individu; serta identifikasi dan analisis mitigasi risiko pameran dalam ruangan dengan penerapan K3L.
Sponsor	:	-
Biaya	:	Estimasi Rp1.100.000; rincian pada bagian 7, belum disahkan.
Klien atau pelanggan	:	Senja Organizer; brief awal menyebut Senja Event & Wedding Planner Batam dan CV. Multi Art Project. Nama resmi, PIC, serta kontak dikonfirmasi kepada mitra.
Waktu	:	<i>14 minggu</i>

1. Ruang lingkup

Proyek Rebranding Visual Senja Organizer mengembangkan kembali identitas merek agar mampu merepresentasikan karakter, nilai, dan pengalaman yang ingin dibangun Senja. Perancangan berangkat dari gagasan bahwa setiap acara merupakan momen dengan cerita dan karakter pemiliknya. Identitas dikembangkan sebagai sistem visual dan verbal yang saling terhubung pada media komunikasi, prototipe akademik, dan pameran hasil PBL.

Masalah yang akan diteliti adalah kesesuaian identitas dan komunikasi Senja saat ini dengan pengalaman yang diharapkan klien. Tim mengaudit aset, mewawancarai mitra serta audiens, dan membandingkan kompetitor untuk mengidentifikasi kesenjangan persepsi. Klaim tentang ketidak konsistenan visual, rendahnya interaksi, atau kelemahan layanan belum diperlakukan sebagai temuan tanpa bukti.

Pertanyaan proyek: bagaimana merancang sistem identitas visual Senja Organizer yang mengomunikasikan pemahaman terhadap karakter, kebutuhan, dan cerita klien, serta dapat diterapkan secara konsisten pada berbagai media? Keberhasilan dinilai melalui keterbacaan, kesesuaian asosiasi dengan positioning dan personality, koherensi penerapan, serta pemahaman informasi oleh audiens.

Ruang lingkup proyek mencakup riset merek dan audiens, penyusunan project brief dan creative brief, pengembangan identitas visual, penerapan pada media komunikasi, pembuatan prototipe, pengujian, serta penyusunan brand guideline. Prototipe UI/UX dan motion logo dikembangkan sebagai bagian dari luaran akademik. Hasil proyek disiapkan untuk pameran dan serah terima kepada mitra.


2. Desain umum

Desain rebranding Senja Organizer berangkat dari gagasan Senja sebagai momen yang berkembang menjadi pengalaman, cerita, dan ingatan. Arah yang diusulkan menempatkan pemahaman terhadap karakter, cerita, kebutuhan, dan preferensi pemilik acara sebagai dasar komunikasi merek. Nilai Understanding, Personalization, Coherence, dan Collaboration diterjemahkan melalui kepribadian Empathetic, Thoughtful, Refined, dan Collaborative.

Perancangan mencakup logo, warna, tipografi, elemen grafis, fotografi, tata letak, dan tone of voice. Sistem identitas diterapkan pada media sosial, katalog layanan, prototipe akademik, serta materi pameran. Identitas Senja tetap konsisten, sementara cerita yang ditampilkan memberi ruang bagi karakter masing-masing klien.

Tim mengembangkan minimal tiga alternatif logo melalui riset visual dan eksplorasi konsep, kemudian memilih serta menyempurnakannya berdasarkan hasil pengujian dan masukan mitra. Bentuk, warna, dan jenis huruf ditetapkan setelah audit; hasil akhir dirangkum dalam logo guideline A4 landscape dan aset penerapannya. Rincian visi, misi, nilai, arah kreatif, dan penulisan wara disajikan pada Lampiran landasan strategi dan arah kreatif.

3. Konstruksi produk

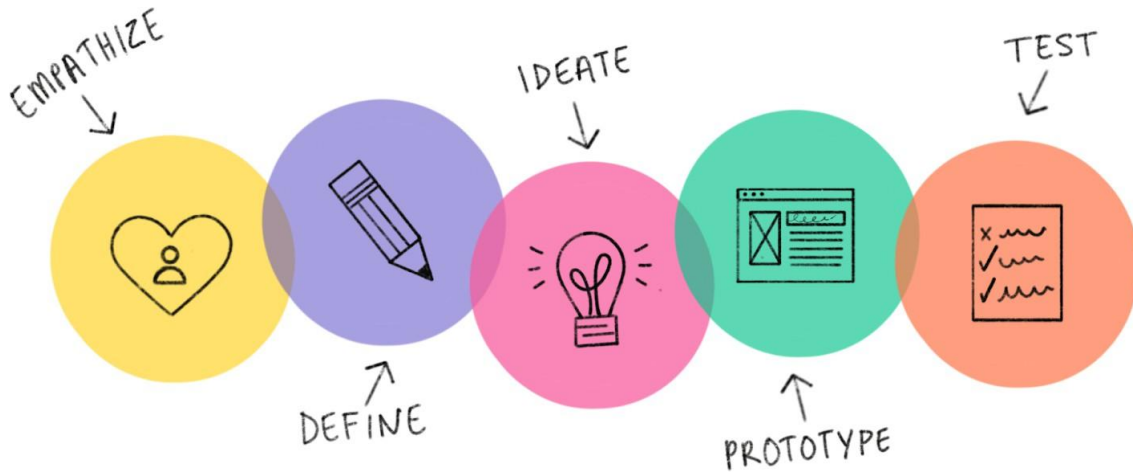

Gambar 1. Metode Design Thinking

Lima fase Design Thinking digunakan secara iteratif. Kerangka CDIO menghubungkan riset pada *Conceive*, pengembangan konsep pada *Design*, produksi pada *Implement*, dan pengujian penggunaan serta pameran pada *Operate*. Pengujian dilakukan sejak alternatif desain tersedia.

Fase	Uraian pekerjaan dan bukti keluaran
Empathize	Wawancara mitra tentang sejarah, praktik memahami klien dan koordinasi vendor; audit identitas; riset audiens dan kompetitor; inventaris aset serta izin. Keluaran: bukti riset dan project brief. Belum menentukan logo atau gaya final.
Define	Analisis masalah, SWOT, audiens, persona, persepsi saat ini dan yang dituju; validasi visi, misi, values, personality, positioning serta proposed USP. Keluaran: creative brief, kriteria keberhasilan dan batas lingkup. Bedakan fakta, asumsi, dan usulan.
Ideate	Eksplorasi kata kunci dan metafora dari strategi; moodboard/stylescape tiga arah; sketsa dan minimal tiga alternatif logo. Jelaskan alasan warna, tipografi, grafis, fotografi, layout dan voice. Rancang alur prototipe dan konsep booth; uji awal untuk memperoleh masukan.
Prototype	Kembangkan logo terpilih beserta variasi, sistem identitas, aplikasi media sosial dan media acara, contoh komunikasi, serta prototipe interaktif. Siapkan guideline A4 landscape, motion logo minimal 10 detik, poster A2, dan materi booth.
Test	Uji keterbacaan, pengenalan dan asosiasi identitas dengan positioning/personality; uji pemahaman pesan dan usability prototipe. Analisis hasil, revisi, uji ulang, finalisasi guideline serta paket aset. Dokumentasikan keterbatasan dan evaluasi pameran.

Rancangan pengujian

Logo diuji pada 16–24 px dan cetak 10–15 mm, monokrom, pengenalan singkat dan kemiripan dengan merek lain. Pengujian persepsi meminta peserta mendeskripsikan kesan sebelum melihat kata sasaran, lalu menilai kesesuaian dengan *Empathetic*, *Thoughtful*, *Refined*, dan *Collaborative* beserta alasannya. Bandingkan identitas awal dan usulan dengan urutan penyajian bervariasi. Penilaian tidak hanya menanyakan desain yang paling disukai.

Usulan uji formatif melibatkan 5–8 calon pengguna yang sesuai kriteria rekrutmen. Catat keberhasilan tugas, kesalahan, waktu penyelesaian, komentar dan temuan revisi. Jumlah tersebut merupakan rencana kerja, bukan sampel representatif pasar. Target awal: minimal 80% peserta menuntaskan setiap tugas inti tanpa bantuan; seluruh masalah kritis diperbaiki dan diuji ulang.

Kriteria kerja usulan: minimal tiga alternatif beserta rasional tersedia; logo terpilih terbaca pada ukuran uji; semua aplikasi menaati guideline; mayoritas peserta mampu menjelaskan pesan pemahaman klien/personalitas acara dengan kata sendiri. Laporkan jumlah peserta dan jawaban aktual, bukan hanya persentase. Keberhasilan branding jangka panjang atau pertumbuhan penjualan tidak disimpulkan dari uji formatif ini.

4. Kebutuhan peralatan dan bahan

Fase	Peralatan atau perangkat	Jumlah	Bahan atau komponen	Catatan
Seluruh fase	Laptop/PC dan internet	6 unit; 1 akses tim	Folder bersama, logbook dan backlog	Utamakan perangkat yang tersedia; cek akses dan cadangan.
Riset	Ponsel/perekam; formulir survei	1–2 unit; 1 formulir	Panduan wawancara, persetujuan partisipan, catatan	Dokumentasi dilakukan dengan izin.
Desain	Perangkat lunak vektor; Figma/Canva sesuai kebutuhan	Akses sesuai PIC	Sketsa, moodboard, font dan aset berlisensi	Utamakan lisensi kampus atau opsi yang dapat digunakan tim.
Produksi	Perangkat lunak motion/video dan pengolah dokumen	Akses sesuai PIC	Master logo, naskah mahasiswa, storyboard	Simpan file sumber dan hasil ekspor.
Pengujian	Laptop dan ponsel; formulir uji	1 set uji	Skenario tugas, data anonim, daftar revisi	Uji pada ukuran layar yang relevan.
Pameran	Layar/laptop, meja, dudukan, kabel dan pengaman	Usulan 1 set booth	1 poster A2, label, QR dan bahan pemasangan	Jumlah final mengikuti denah dan izin peminjaman.

5. Tantangan dan isu

Register awal berikut menggunakan skala kerja sementara: kemungkinan (a) dan keparahan (b) masing-masing 1–3; total $a \times b$; rendah 1–2, sedang 3–4, tinggi 6–9. Penilaian harus divalidasi melalui borang No.FO.17.1.1-V0 dan survei lokasi. Angka berikut merupakan estimasi awal tim, bukan hasil asesmen resmi.

No	Fase	Tantangan	Risiko	a	b	$a \times b$	Tingkat	Pengendalian dan PIC
1	Riset	Brief belum jelas	Revisi lingkup	3	2	6	Tinggi	Sahkan brief dan batas pekerjaan; ketua tim.
2	Produksi	Versi file tertukar	Aset hilang/salah	2	2	4	Sedang	Penamaan versi, backup dan log perubahan; PIC aset.
3	Desain	Aset atau klaim tanpa bukti	Keberatan mitra	2	3	6	Tinggi	Periksa izin aset dan bukti klaim sebelum publikasi; PIC konten.
4	Test	Peserta tidak sesuai	Kesimpulan bias	2	2	4	Sedang	Kriteria rekrutmen, instrumen konsisten, catat batas studi; PIC UX.
5	Pameran	Kabel di jalur pengunjung	Tersandung	2	3	6	Tinggi	Pelindung kabel dan jalur bersih; PIC teknis.
6	Pameran	Layar/internet gagal	Demo berhenti	2	2	4	Sedang	Demo offline, uji perangkat dan cadangan file; PIC teknis.
7	Pameran	Instalasi/listrik tidak siap	Cedera/kerusakan	2	3	6	Tinggi	Cek pemasangan bersama teknisi venue; jangan operasikan sebelum aman; ketua booth.

6. Estimasi waktu pekerjaan

Linimasa 14 minggu bersifat iteratif. Kegiatan antarmata kuliah berjalan paralel; persiapan pameran dimulai minggu 4–7. Tanggal evaluasi mengikuti panduan dan pengumuman terbaru dari pengajar.

Fase atau minggu	Uraian pekerjaan	Estimasi	Bukti dan titik pemeriksaan
Empathize M1–M2	Wawancara, audit identitas dan media, riset calon pelanggan, inventaris aset dan kebutuhan mitra.	2 minggu	Project brief dan data riset; masalah belum dianggap terbukti sebelum data ditelaah.
Define M3	Analisis audit, SWOT/kompetitor, audiens dan persona; validasi visi, misi, values, personality, proposed positioning/USP; creative brief serta kriteria penerimaan.	1 minggu	Brief yang dibahas dengan mitra dan manajer proyek.
Ideate dan uji awal M4–M5	Eksplorasi tiga arah kreatif berbasis Moment; minimal tiga alternatif logo; formula warna dan voice, struktur prototipe dan wireframe; uji awal serta konsep pameran.	2 minggu	Alternatif beserta hasil uji awal; draf naskah mahasiswa dan daftar revisi.
Prototype awal M6–M7	Aplikasi identitas pada media, draf guideline, prototipe awal, konsep booth, RAB, alur acara dan risiko; persiapan pitching.	2 minggu	Cakupan draf lintas mata kuliah untuk evaluasi tengah semester.
Prototype lanjutan M8–M10	Perbaikan hasil evaluasi; desain antarmuka lengkap, prototipe interaktif, konten lintas media, motion logo dan poster.	3 minggu	Aset produksi dan prototipe siap uji; pemeriksaan kesesuaian brief.
Test dan revisi M11–M12	Uji logo, pemahaman warna dan usability; analisis data, perbaikan dan pengujian ulang; gladi teknis pameran.	2 minggu	Laporan pengujian, revisi, technical rider, SOP dan daftar kesiapan.
Finalisasi dan Operate M13–M14	Finalisasi guideline, laporan, HKI/BAST, portofolio, aset dan materi pameran; pelaksanaan/evaluasi pameran mengikuti jadwal resmi.	2 minggu	Paket serah terima, dokumentasi dan laporan evaluasi.
Total	Durasi fase utama; pengujian dan koordinasi berlangsung berulang.	14 minggu	Evaluasi akademik mengikuti kalender kampus.

Target evaluasi berdasarkan Panduan Branding Project 2026

Tengah semester: progres minimal 50% dengan bukti logbook dan backlog SIAP PBL. Siapkan draf strategi, minimal tiga alternatif logo dan hasil uji, formula warna/voice/tagline, konsep media interaktif, UI, wireframe, pameran, portofolio dan risiko. Panduan mencantumkan batas unggah slide 23 Oktober 2026 serta pitching berbahasa Inggris maksimal 10 menit dan tanya jawab 10 menit.

Akhir semester: progres minimal 80% untuk kelayakan evaluasi; seluruh luaran akhir tetap ditargetkan selesai. Panduan mencantumkan pameran minggu kedua UAS dan batas pengumpulan dokumen 5 Januari 2027. Ketua tim memeriksa perubahan jadwal melalui pengajar dan SIAP PBL. Angka progres evaluasi tidak menggantikan kewajiban menyelesaikan paket serah terima.

7. Biaya proyek

RAB ini adalah estimasi perencanaan internal, bukan penawaran penyedia. Perangkat milik anggota dan peminjaman kampus diasumsikan tanpa biaya tambahan. Harga, sumber dana, serta kontribusi pameran bersama ditetapkan setelah survei dan persetujuan tim/mitra.

Fase	Uraian dan perhitungan	Perkiraan biaya	Catatan
Riset	Transportasi 2 kunjungan × Rp75.000	Rp150.000	Asumsi kunjungan lokal
Koordinasi	Internet tambahan 1 paket tim × Rp100.000	Rp100.000	Di luar akses yang tersedia
Produksi	Cetak uji logo dan media 1 paket × Rp100.000	Rp100.000	Uji keterbacaan dan warna
Pameran	Poster A2 1 lembar × Rp75.000	Rp75.000	Spesifikasi cetak dikonfirmasi
Pameran	Label dan materi pendukung 1 paket × Rp125.000	Rp125.000	Termasuk informasi/QR
Pameran	Bahan booth dan pengamanan kabel 1 paket × Rp300.000	Rp300.000	Sesuaikan kontribusi kelas
Pelaporan	Dokumentasi dan serah terima 1 paket × Rp150.000	Rp150.000	Cetak/penyimpanan seperlunya
Subtotal	Jumlah estimasi biaya langsung	Rp1.000.000	Belum termasuk biaya baru di luar lingkup
Cadangan	10% × Rp1.000.000	Rp100.000	Dicatat penggunaannya
Total	Subtotal + cadangan	Rp1.100.000	Estimasi, belum disahkan

8. Tim proyek

Tim mahasiswa berikut sesuai daftar kelompok. Penugasan dosen/laboran serta NIK mengikuti penetapan resmi manajer proyek. Pembagian PIC di bawah merupakan usulan kerja dan dapat disesuaikan menurut kompetensi anggota.

No	Nama	NIM	Program studi dan usulan tanggung jawab
1	Ashsyura Az Zahra	4312411071	TRM; ketua tim, koordinasi dan pengendalian jadwal
2	Meliska Grenova Sinaga	4312411052	TRM; riset merek dan copywriter
3	Olyn Novita Dewi	4312411058	TRM; identitas visual dan guideline
4	Erisa Junita	4312411064	TRM; desain grafis dan layout
5	Metia Azzahra	4312432003	TRM; media sosial dan konten
6	Ivan Suhendra S	4312431005	TRM; presentasi dan dokumentasi

Peran dasar mengikuti usulan pada project brief. Usulan tugas tambahan lintas mata kuliah: Ivan pada prototipe/teknis, Metia pada koordinasi uji pengguna, serta Olyn dan Erisa pada motion/logo/poster. Seluruh anggota ikut pengujian, laporan dan pameran; setiap anggota menyusun portofolio pribadinya.

9. Ruang kerja dan laboratorium

Workspace kampus mengikuti persetujuan peminjaman; nomor ruang final dikonfirmasi. Pertemuan mitra dilakukan di lokasi yang disepakati atau secara daring. Acuan venue pameran dalam panduan adalah Auditorium GU lantai 2 pada minggu kedua UAS; alokasi booth dan jadwal teknis mengikuti panitia.

10. Mata kuliah dan capaian pembelajaran yang terlibat

Mata kuliah mengikuti tujuh mata kuliah Branding Project 2026. Kolom capaian memetakan pekerjaan Senja; rumusan CLO resmi digunakan untuk TRM527 dan TRM532 yang lesson plan-nya tersedia. Untuk mata kuliah lain, indikator kerja berikut perlu dicocokkan pengajar dengan CPMK resmi.

No	Mata kuliah	Capaian dalam proyek	CPMK atau indikator dan bukti
1	TRM527 Penjenamaan 4 SKS	Menganalisis kebutuhan identitas Senja dan mengembangkan sistem visual yang konsisten.	CLO 1–6: identifikasi kebutuhan; analisis strategi; pengembangan identitas; aplikasi ke media; publikasi panduan; teamwork. Bukti: project/creative brief, alternatif dan pengujian logo, guideline A4 landscape.
2	TRM528 Penulisan Wara 3 SKS	Menyusun komunikasi persuasif berdasarkan karakter merek dan kebutuhan audiens.	Indikator: enam unsur wara, formula AIDA/PAS/FAB/4C yang relevan, persona/ego audiens, premis, retorika, curiosity gap, voice/tone dan CTA lintas media. Bukti: copywriting guideline dan tagline untuk media sosial serta website, draf dan revisi.
3	TRM529 Media Digital Interaktif 3 SKS	Mengembangkan prototipe dengan interaksi dan respons yang jelas.	Indikator: merancang konsep, narasi dan logika interaktif; membuat serta mengevaluasi prototipe. Bukti: prototipe layanan Senja dengan alur informasi menuju kontak/konsultasi.
4	TRM530 Desain Antar Muka 3 SKS	Menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi antarmuka yang konsisten dengan identitas Senja.	Indikator: hierarki informasi, tata letak, navigasi, konsistensi komponen dan adaptasi layar. Bukti: dokumen desain/implementasi antarmuka website atau aplikasi sesuai luaran mata kuliah.
5	TRM531 Desain Pengalaman Pengguna 3 SKS	Merancang pengalaman berdasarkan riset pengguna serta mengevaluasi usability.	Indikator: kebutuhan pengguna, persona, use case, wireframe, skenario uji dan analisis perbaikan. Bukti: riset pengguna, hasil pengujian usability dan riwayat revisi.
6	TRM532 Tata Kelola Pameran 2 SKS	Mengemas hasil rebranding menjadi pengalaman pameran yang terkurasi dan layak dilaksanakan.	CLO 1–6: diversifikasi pameran; konsep; tim dan alur acara; kuratorial; pelaksanaan; teamwork. Bukti: rancangan booth, manajemen kru, alur pengunjung, RAB, risiko K3L dan evaluasi.
7	TRM533 Pengembangan Portofolio 3 SKS	Mengkurasi dan menyajikan bukti kontribusi serta kompetensi individu.	Indikator: pemilihan karya, narasi proses, visualisasi, revisi dan publikasi portofolio. Bukti: portofolio tiap anggota dan QR/tautan untuk pameran.

TRM527 merupakan mata kuliah proyek; TRM528–TRM533 merupakan mata kuliah pendukung menurut Panduan Branding Project 2026. Pelaksanaan dan penilaian tetap mengikuti pengajar masing-masing.

11. Komunikasi antara manajer proyek dan klien

Tabel ini merupakan agenda komunikasi yang harus dijawab melalui pertemuan resmi. Keputusan, tanggal, penanggung jawab dan tautan bukti dicatat setelah pertemuan; tidak dianggap sebagai persetujuan sebelum dikonfirmasi.

Fase	Pertanyaan atau keputusan	Jawaban atau status	Tindak lanjut
Empathize	Siapa PIC Senja, apa layanan utama, target pelanggan dan masalah identitas saat ini?	Menunggu wawancara mitra.	Ketua menjadwalkan pertemuan; riset mencatat bukti.
Define	Apakah arah story-led sesuai praktik dan kemampuan Senja? Nilai, positioning, batas personalisasi, ruang lingkup, dan kriteria apa yang disepakati?	Menunggu validasi project/creative brief.	Ketua, manajer proyek dan PIC mitra memvalidasi acuan kerja.
Ideate	Alternatif logo dan arah komunikasi mana yang paling sesuai?	Diputuskan setelah presentasi alternatif dan umpan balik.	Catat alasan pemilihan dan revisi.
Prototype	Apakah informasi layanan, konten dan alur kontak sudah sesuai?	Menunggu reviu prototipe.	PIC konten/UI menindaklanjuti daftar masalah.
Test/serah terima	Apakah luaran memenuhi kriteria; apa aset dan hak penggunaan yang diserahkan?	Menunggu hasil uji dan pemeriksaan akhir.	Manajer proyek/PIC mitra memeriksa daftar aset dan BAST.

12. Monitoring dan evaluasi

Pertemuan tim dan manajer proyek direncanakan minimal sekali setiap minggu. Ketua memelihara backlog berisi pekerjaan, PIC, tenggat, status, bukti dan kendala; setiap anggota memperbarui logbook SIAP PBL. Perubahan lingkup, biaya atau tenggat harus disertai dampak dan keputusan tertulis.

Objek evaluasi	Kriteria pemeriksaan	Bukti yang disimpan
Identitas dan wara	Keterbacaan, hubungan dengan values/personality dan positioning, koherensi aplikasi, pemahaman pesan serta bukti klaim.	Instrumen, hasil pengujian, komentar mitra dan revisi.
Prototipe/UI/UX	Tugas inti dapat diselesaikan; navigasi, respons dan konten dipahami.	Keberhasilan tugas, kesalahan, waktu dan perbaikan.
Pameran	Karya terkurasi, alur jelas, perangkat berfungsi, kru siap, risiko ditangani.	Denah, technical rider, uji teknis, absensi, dokumentasi, survei dan laporan biaya.
Kontribusi dan serah terima	Kontribusi individu dapat ditelusuri; seluruh aset dan dokumen diperiksa.	Logbook, backlog, portofolio, daftar aset dan BAST.

Penilaian mengikuti panduan: kontribusi manajer proyek 30% dan pengajar mata kuliah 70%, dengan rubrik masing-masing. Evaluasi pameran membandingkan tujuan, realisasi kegiatan/biaya, umpan balik pengunjung, kendala serta tindakan perbaikan. Hasil pengujian dilaporkan apa adanya, termasuk keterbatasannya.

13. Riwayat perubahan proyek

Revisi dan tanggal	Deskripsi perubahan	Pengusul atau penanggung jawab
01 / 2 Oktober 2026	Penyesuaian contoh E-Koperasi menjadi Rebranding Visual Senja Wedding Organizer; penyesuaian tujuh mata kuliah, luaran, jadwal, tim, risiko dan evaluasi dengan materi 2026.	Tim PBL Senja; menunggu review manajer proyek
02 / 5 Oktober 2026	Penyesuaian strategi dengan referensi.md: Senja = Moment, visi/misi, values/personality, tiga arah kreatif, Design Thinking dan pengujian persepsi. Mandatori visual lama menjadi bahan validasi.	Tim PBL Senja; diajukan untuk review
03 / 5 Oktober 2026	Perapian identitas dan daftar luaran; penyesuaian biaya pada identitas; peringkasan Desain Umum dan pemindahan rincian strategi ke lampiran.	Tim PBL Senja
Revisi berikutnya	Diisi setelah terdapat keputusan perubahan lingkup, rancangan, jadwal atau biaya.	Dicatat oleh ketua tim

Tanda tangan persetujuan

Batam, / / 2026

Persetujuan diberikan setelah isi RPP diverifikasi oleh pihak berwenang. Nama jabatan dan penandatanganan mengikuti penetapan resmi. Ruang di bawah belum merupakan pengesahan.

Manajer proyek	PIC Senja Wedding Organizer
Nama: NIK:	Nama: Jabatan:

P3M	SHILAU	Pihak akademik terkait
Nama: NIK:	Nama: NIK:	Nama: NIK:

Hal yang diselesaikan sebelum pengesahan

Konfirmasi kode PBL, nama resmi merek, kelas, pengusul/manajer proyek dan PIC mitra; validasi temuan riset serta creative brief; sepakati PIC anggota, fitur prototipe, RAB dan sumber dana; cocokkan CPMK dengan lesson plan pengajar; tetapkan jadwal serta alokasi booth. Lampirkan project brief dan borang risiko yang telah divalidasi.

Lampiran acuan materi perkuliahan

Acuan berikut menjadi dasar perencanaan dan memudahkan penelusuran hubungan antara materi, pekerjaan dan luaran. Nomor halaman merujuk urutan halaman PDF, termasuk sampul.

Acuan lokal	Pokok yang diterapkan	Bagian RPP
Panduan Branding Project 2026.pdf, hlm. 3–6	Tujuh mata kuliah, peran manajer, spesifikasi luaran, dokumen pendukung, HKI eksternal dan BAST.	Identitas; 1; 3; 10
Panduan Branding Project 2026.pdf, hlm. 7–19	Linimasa, evaluasi tengah/akhir, logbook, backlog, tenggat dan penilaian.	6; 11; 12
Pertemuan2_Penjenamaan Visual.pdf, hlm. 20–21; Pertemuan3_Creative Brief.pdf, hlm. 2–7	Analisis brand value, positioning, pasar sasaran, tujuan komunikasi dan arahan kreatif.	1; 2; 3
Pertemuan4_Desain Identitas Visual.pdf, hlm. 14–27	Prinsip logo, eksplorasi minimal tiga alternatif, validasi, file akhir dan guideline.	2; 3; 6; 12
Lesson Plan TRM527 Penjenamaan 2026, bagian III, V dan VII	Tujuan dan CLO Penjenamaan serta tahap CDIO.	3; 6; 10
pengantar_penulisan wara.txt; tipe_dan_pola_penulisan_wara.txt	Unsur wara, tangible/intangible, AIDA, PAS, FAB, 4C serta pola storytelling.	2; 3; 10
Persona & Target Audiens.pdf, hlm. 2–17	Persona target dan gaya penulis; kebutuhan, keinginan, citra diri serta ego audiens.	2; 3; 10
Premis Corius.pdf, hlm. 3–19; INTEGRASI MEDIA DIGITA.pdf, hlm. 3–19	Premis, retorika, curiosity gap, pesan lintas media, voice, tone dan CTA.	2; 3; 10
Template penulisan Integrasi Media.pdf, hlm. 1	Tugas individu mengisi premis, persona, ego, curiosity gap dan integrasi media. Kalimat wara dikerjakan mahasiswa sesuai ketentuan tugas.	2; 10
Lesson Plan TRM532 Tata Kelola Pameran 2026, hlm. 1–3; tugas minggu 4–7	CLO pameran, peran kru, sepuluh komponen perencanaan, absensi dan evaluasi tim.	2; 4–6; 10; 12
Kuratorial_Karya_Multimedia.pdf, hlm. 2–6 dan 9; Manajemen_Produksi_Pameran_Multimedia.pdf, hlm. 3–5 dan 8	Seleksi/narasi/label, alur pengunjung, kelayakan teknis, RAB, jadwal, risiko, SOP serta evaluasi.	2–6; 12

Lampiran pelaksanaan yang dikembangkan selama proyek: project brief, creative brief, catatan riset, hasil pengujian logo/wara/usability, guideline, prototipe, denah dan technical rider, Gantt, RAB final, borang risiko No.FO.17.1.1-V0, dokumentasi pameran, portofolio, draf HKI dan BAST.

Lampiran asumsi kerja khusus Senja

Landasan strategi usulan mengikuti referensi.md. Profil dan segmentasi dari brief awal tetap menjadi bahan validasi; tidak otomatis merupakan hasil riset. Angka pengikut, engagement, konversi, harga dan hasil layanan memerlukan bukti bertanggal. Mandatori logo sunset, palet golden hour, dan tagline pada brief awal dibahas kembali bersama mitra berdasarkan audit dan strategi terbaru.

Aspek	Asumsi dan keputusan rancangan	Cara memeriksa
Segmen utama	Brief menetapkan calon pengantin 22–35 tahun di Batam–Kepri, kelas menengah, aktif di Instagram. Asumsi kerja yang diuji: pasangan bekerja, rencana menikah 6–12 bulan lagi dan membandingkan beberapa WO.	Tanyakan jadwal persiapan, pihak pengambil keputusan, sumber informasi, dan alasan memilih WO kepada calon pelanggan.
Persona kerja	Persona ilustratif: Rani, 27 tahun, karyawan di Batam, menyiapkan pernikahan bersama pasangan. Ia ingin pembagian tugas jelas dan waktu bersama keluarga, tetapi belum paham batas pekerjaan WO dibanding vendor.	Persona ini bukan responden nyata. Cocokkan kebutuhan dan hambatannya dengan wawancara pengguna.
Layanan yang diprioritaskan	Asumsi fokus Senja: koordinasi persiapan dan pelaksanaan hari pernikahan. Prototipe menjelaskan alur diskusi kebutuhan, penentuan cakupan, koordinasi dan pelaksanaan.	Minta daftar layanan, tugas yang termasuk/tidak termasuk, proses konsultasi dan wilayah layanan dari mitra. Jangan menyamakan WO dengan paket dekorasi/katering.
Positioning awal	Senja diarahkan sebagai organizer yang memulai perancangan dari karakter, cerita, kebutuhan dan preferensi pemilik acara, lalu menerjemahkannya menjadi pengalaman yang personal dan utuh.	Validasi wawancara klien, contoh proses layanan, kebutuhan audiens dan kompetitor. Tetap sebagai proposed positioning sampai terbukti.
Arah visual	Eksplorasi Moment, Experience, Story, Memory melalui tiga arah kreatif. Bentuk, warna dan tipografi mengikuti strategi serta hasil pengujian; tidak dikunci pada sunset, emas/cokelat atau serif mewah.	Audit identitas lama, bandingkan alternatif, dan uji keterbacaan, asosiasi, orisinalitas serta konsistensi penerapan. Pertahankan aset lama jika ada alasan berbasis bukti.
Konten prioritas	Konten menggambarkan pemahaman kebutuhan, cerita di balik keputusan konsep, hubungan detail, koordinasi vendor, serta informasi layanan dan konsultasi. Tone mengikuti konteks, dengan voice empatik dan kolaboratif.	Minta peserta menjelaskan pendekatan Senja dan hubungannya dengan kebutuhan klien. Gunakan hanya kisah, foto dan testimoni yang terverifikasi serta berizin.
Interaksi utama	Prototipe memungkinkan pengguna menjelajah layanan dan portofolio, kemudian membuka simulasi konsultasi. Input yang diusulkan: nama, tanggal rencana, lokasi dan kebutuhan.	Uji tugas tanpa bantuan. Data yang dimasukkan pada demo adalah data contoh; pengiriman ke kanal nyata di luar lingkup prototipe.
Bukti kepercayaan	Tampilkan portofolio, penjelasan proses dan identitas kontak yang diizinkan mitra. Testimoni hanya digunakan jika autentik serta mendapat izin.	Periksa sumber dan izin setiap foto, ulasan, angka pengalaman, harga dan klaim layanan sebelum dipublikasikan.

Skenario uji yang sesuai layanan

Skenario 1: Anda akan menikah enam bulan lagi di Batam. Temukan layanan yang relevan dan jelaskan apa yang ditangani Senja. Skenario 2: Cari contoh acara yang membantu Anda menilai kecocokan layanan. Skenario 3: Temukan cara berkonsultasi dan sebutkan informasi yang perlu Anda siapkan. Tim mencatat keberhasilan, titik bingung, waktu, dan pertanyaan yang belum terjawab.

Penyelarasan brief dengan rencana semester: brief memuat timeline usulan enam minggu dan tahun akademik 2025/2026. RPP menggunakan 14 minggu serta tahun 2026/2027 sesuai panduan kuliah yang berlaku pada berkas semester ini. Pekerjaan enam minggu diperlakukan sebagai paket awal pengembangan identitas, dilanjutkan integrasi luaran, pengujian dan pameran. Cakupan sekunder event korporat/komunitas tidak menjadi fokus uji utama calon pengantin.

Acuan strategi: referensi.md, khususnya bagian 1–15 dan 19–24. Acuan identitas anggota dan profil awal: Creative-Brief-dan-Project-Brief-Senja-WO.docx. Ketentuan visual dan tagline brief awal diperbarui melalui validasi mitra; tidak dianggap telah disetujui dalam RPP ini. Harga layanan hanya dicantumkan setelah dikonfirmasi. Prototipe digunakan sebagai demonstrasi akademik.



No.FO.8.6.1-V1 Format Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP)

3 November 2023

Lampiran landasan strategi dan arah kreatif

Landasan strategi merek

Visi: Mengubah momen yang direncanakan hari ini menjadi cerita yang layak dikenang setelah perayaan berakhir.

Misi 1: Memahami karakter, kebutuhan, dan preferensi setiap klien sebagai dasar pengembangan konsep. Misi 2: Mengembangkan pengalaman acara yang relevan dengan cerita dan karakter pemilik acara. Misi 3: Menghindari pendekatan satu konsep untuk semua dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Misi 4: Menyatukan konsep, visual, detail, dan pengalaman tamu menjadi satu karakter acara yang konsisten. Misi 5: Berkolaborasi dengan vendor untuk menjaga keutuhan konsep dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Understanding diwujudkan melalui mendengar dan menggali kebutuhan. Personalization menjadikan pemahaman terhadap klien sebagai dasar keputusan. Coherence menghubungkan seluruh detail pada cerita utama. Collaboration menjaga kesamaan pemahaman antara klien, Senja, dan vendor.

Personality yang dituju adalah Empathetic, Thoughtful, Refined, dan Collaborative. Implikasinya: komunikasi yang mendengar, keputusan desain beralasan, hierarki visual yang jelas dan tidak berlebihan, serta hubungan kerja yang terbuka dengan arahan yang tetap tegas.

Proses usulan: Understand, Translate, Personalize, Unify, Deliver; Remember merupakan hasil yang diharapkan. Prinsip internal "This feels like us" dipakai untuk menilai relevansi pengalaman bagi klien. Memorability merupakan hasil, bukan core value atau USP yang telah terbukti. Pernyataan konsep dalam referensi belum menjadi tagline final.

Identitas Senja dan identitas acara klien

Logo, aturan warna, tipografi, dan gaya komunikasi Senja harus konsisten. Personalisasi diterapkan pada isi cerita dan ekspresi acara sesuai kebutuhan pemiliknya; tidak berarti mengganti identitas Senja untuk setiap klien. PBL menghasilkan sistem identitas dan contoh penerapan, bukan pelaksanaan acara klien atau perubahan operasional layanan yang belum disepakati.



No.FO.8.6.1-V1 Format Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP)

3 November 2023

Alternatif arah kreatif

Arah A — Moments into Memories. Fokus pada pengalaman yang meninggalkan ingatan. Eksplorasi visual menelaah jejak momen, hubungan antarbagian cerita, dan fotografi interaksi yang bermakna. Kesan yang diuji: intim, thoughtful, dan refined.

Arah B — Every Story Its Own Moment. Fokus pada personalisasi. Eksplorasi menelaah sistem bingkai atau elemen grafis adaptif yang memberi ruang bagi cerita berbeda, dengan identitas Senja sebagai pengikat. Kesan yang diuji: personal, empatik, dan ekspresif sesuai karakter klien.

Arah C — The Art of Transition. Fokus pada perjalanan dan peralihan momen. Eksplorasi menelaah ritme, urutan, ruang, dan perubahan bentuk tanpa kewajiban menggunakan simbol sunset. Kesan yang diuji: thoughtful, refined, dan berkembang secara utuh.

Ketiga arah merupakan alternatif eksplorasi kelompok yang sama, bukan pembagian anggota menjadi Tim A, B, dan C. Semuanya menggunakan visi, nilai, dan positioning yang sama. Warna, jenis huruf, dan bentuk logo belum dikunci. Logo lama dinilai berdasarkan ekuitas, keterbacaan, relevansi, dan temuan audit sebelum diputuskan untuk dipertahankan, disempurnakan, atau diubah.

Pemilihan arah menggunakan bukti riset, kesesuaian personality, pembeda terhadap kompetitor, keterbacaan, serta kelayakan penerapan. Setiap keputusan menjelaskan alasan, sumber, pembeda, penerjemahan ke visual/verbal, dan status buktinya.

Arahan penulisan wara

Komunikasi menguraikan cara Senja memahami karakter, kebutuhan, dan cerita klien sebagai dasar penyusunan konsep acara. Pesan didukung contoh proses atau portofolio yang dapat diverifikasi dan diizinkan mitra. Usulan key message: Senja memahami karakter dan kebutuhan klien, lalu menerjemahkannya ke dalam konsep acara yang sesuai.

Enam unsur yang disusun tim adalah identitas merek, headline, subheadline, body copy, tagline, dan call to action. AIDA digunakan sebagai formula utama pada pengenalan merek; PAS dapat digunakan pada konten masalah dan solusi. FAB hanya dipakai setelah fitur dan manfaat layanan terverifikasi. Seluruh naskah diperiksa dengan 4C: clear, concise, compelling, credible.

Voice diusulkan empatik, penuh pertimbangan, jelas, dan kolaboratif. Tone lebih informatif pada layanan, lebih naratif pada cerita portofolio, dan lebih mengundang dialog pada konsultasi. Pesan menghindari sentimentalitas berlebihan, janji kesempurnaan, serta klaim keunggulan tanpa bukti. Naskah final disusun dan diuji sesuai materi Penulisan Wara.

Tim merumuskan premis masalah, fakta dasar, dan arah solusi; memilih retorika yang relevan; serta menguji curiosity gap yang terjawab oleh isi konten. Pesan inti diadaptasi untuk cetak, audio/video, dan digital. Naskah serta tagline final disusun mahasiswa dan direviu sesuai ketentuan tugas Penulisan Wara.
